

## Книжная кампания: результаты и план запуска

Решение для руководителя: согласовать бюджет 1,2 млн ₽ и календарь кампании.

Цель — поддержать продажи подборки книг в трёх каналах.

Все числа в примере — учебные данные, не отчёт компаний марафона.

## Что требуется согласовать

- Бюджет: 1 200 тыс. ₽.
- Старт продвижения: **15 октября 2026 года.**
- Продолжительность продвижения: **14 календарных дней.**
- Еженедельный контроль продаж, расходов и готовности материалов.

## Исходные данные: один период, одинаковые единицы

| Канал        | Экземпляры    | Выручка, тыс. ₽ |
|--------------|---------------|-----------------|
| Магазины     | 2 400         | 1 440           |
| Маркетплейсы | 3 600         | 1 980           |
| Цифровой     | 4 000         | 1 200           |
| <b>Итого</b> | <b>10 000</b> | <b>4 620</b>    |

Один четырёхнедельный период. Выручка не равна прибыли.


# Цифровой канал лидирует по количеству



4 000 экземпляров — 40% количества. Это не доля выручки.

Контроль:  $2\,400 + 3\,600 + 4\,000 = 10\,000$ .


# Недельные продажи растут в учебном примере

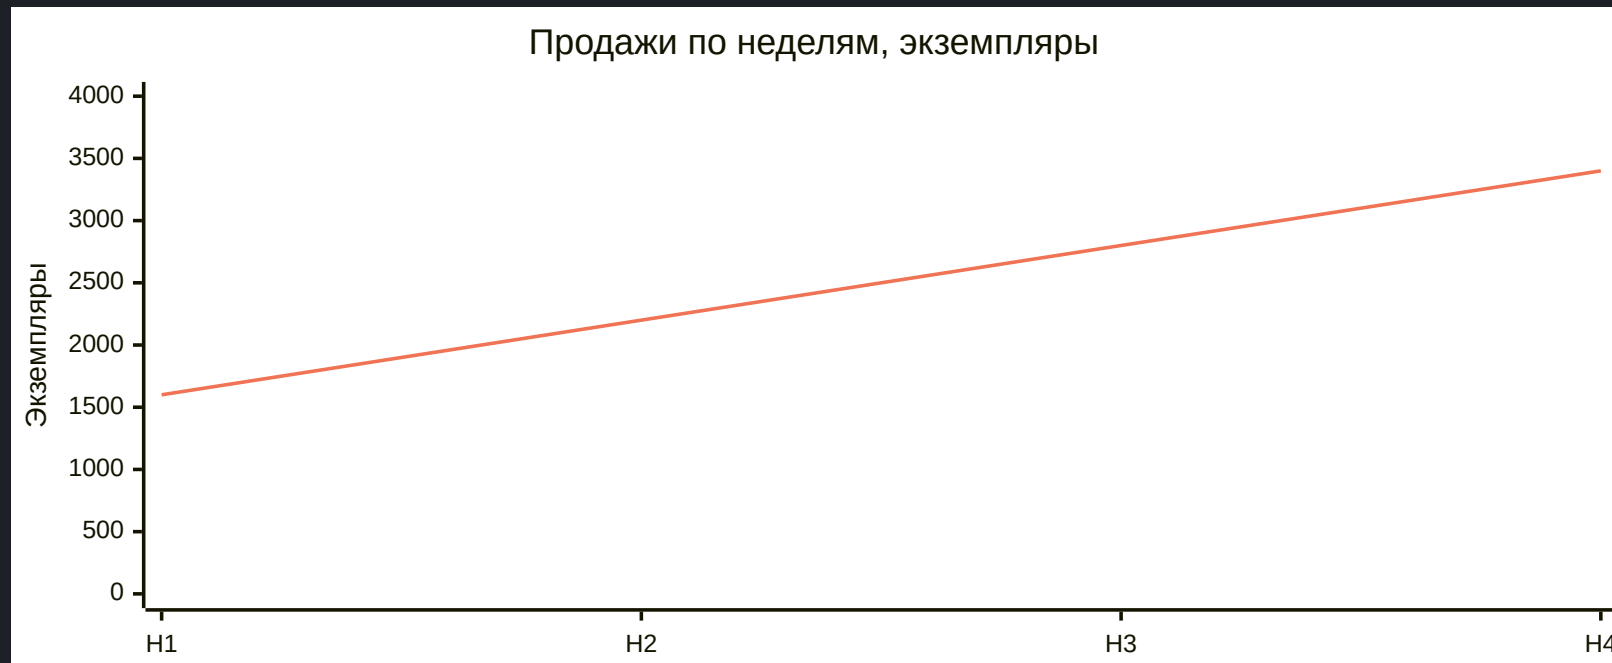

H1: 1 600 · H2: 2 200 · H3: 2 800 · H4: 3 400.

Сумма — 10 000. Рост с H1 до H4 — 112,5%; причинный эффект рекламы не доказан.

## Половину бюджета направляем на рекламу

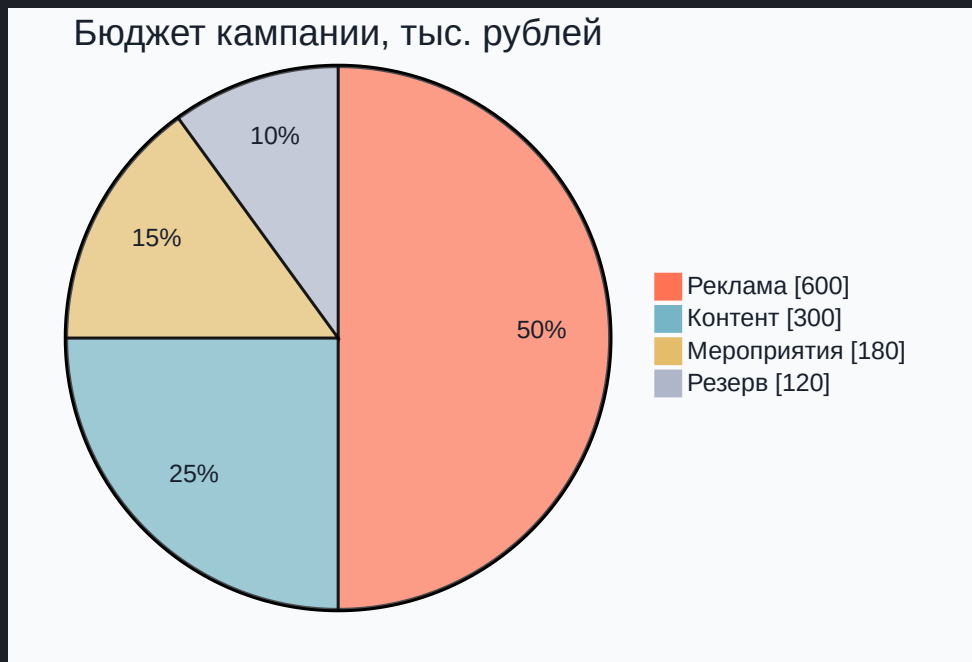

$600 + 300 + 180 + 120 = 1\,200$  тыс. ₽.


Доли: 50% / 25% / 15% / 10%.

## У расходов есть назначение и ответственный

| Статья      | Тыс. ₽ | Доля | Назначение                      |
|-------------|--------|------|---------------------------------|
| Реклама     | 600    | 50%  | Привлечь читателей              |
| Контент     | 300    | 25%  | Подготовить материалы           |
| Мероприятия | 180    | 15%  | Представить подборку            |
| Резерв      | 120    | 10%  | Покрыть согласованные изменения |


Резерв расходуется только после отдельного согласования.

## Материалы проходят проверку до запуска

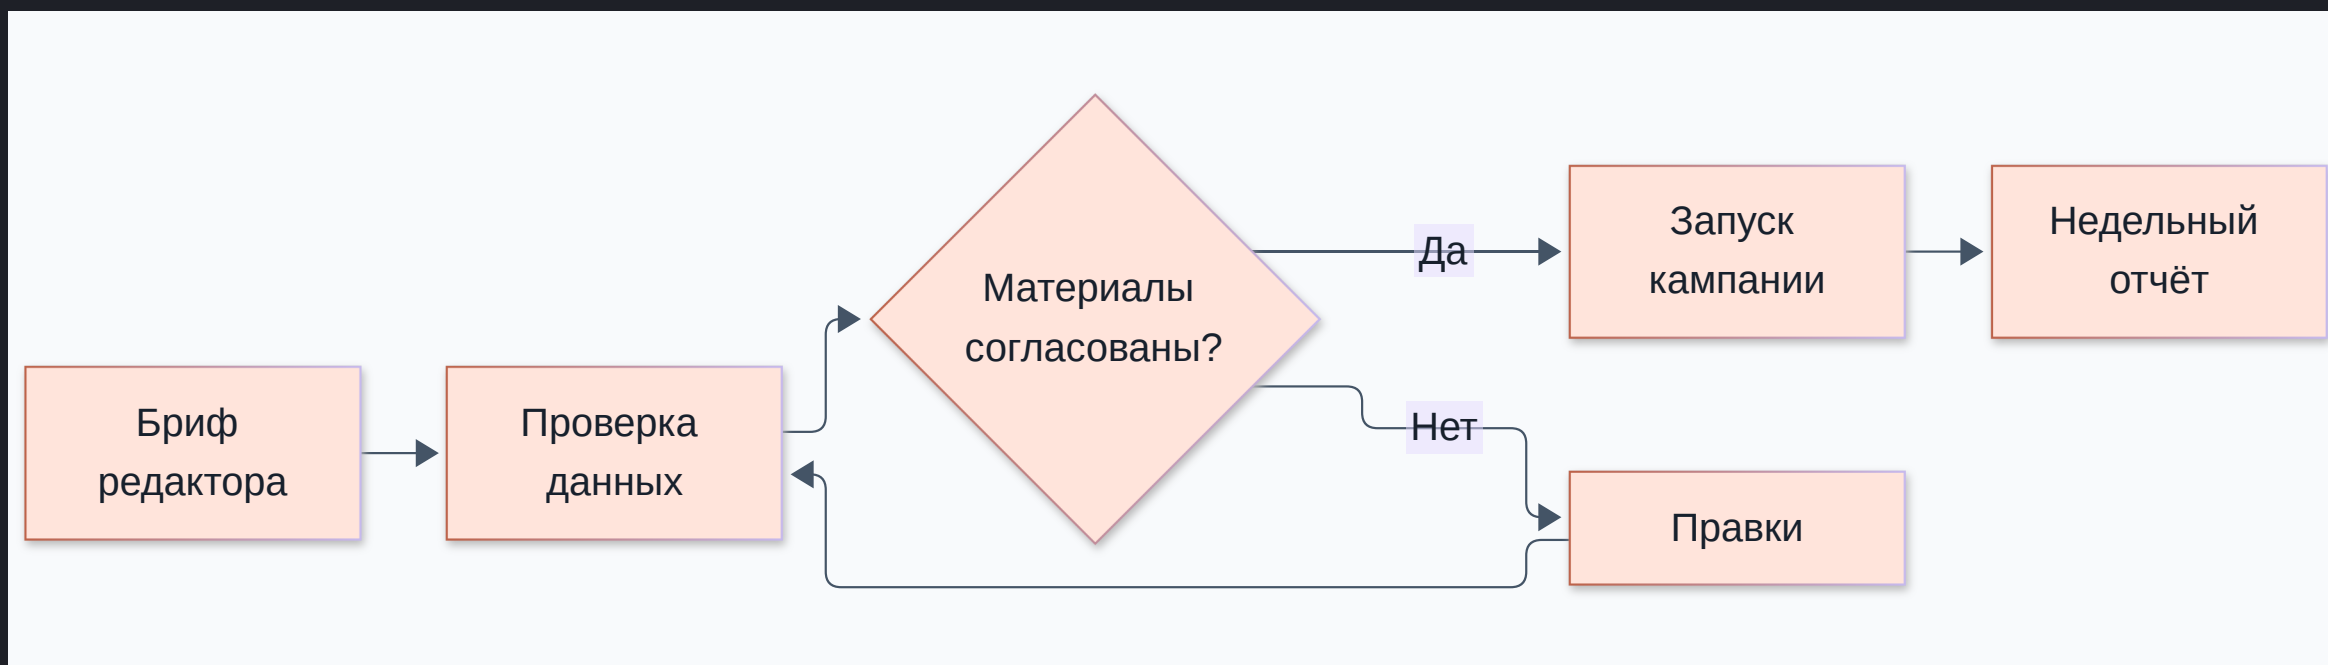


Правки возвращаются на проверку данных; запуск разрешён после согласования.

# Редактор и маркетолог согласуют один макет

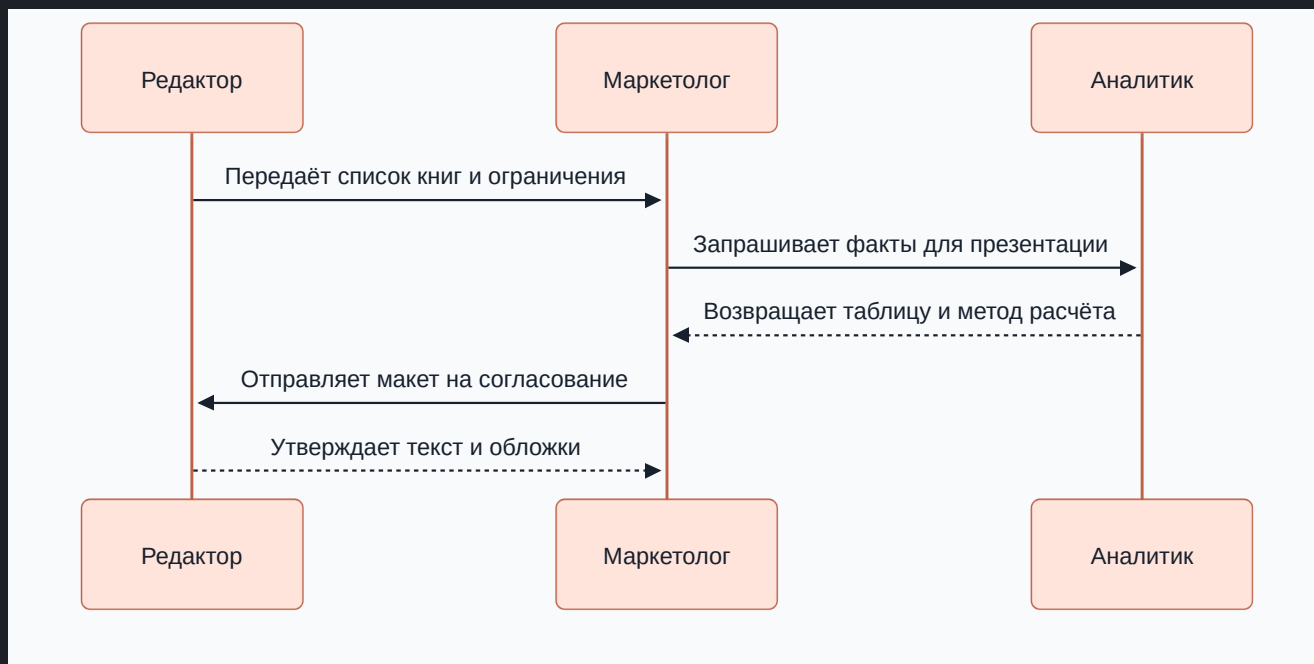

# Запуск зависит от готовности контента

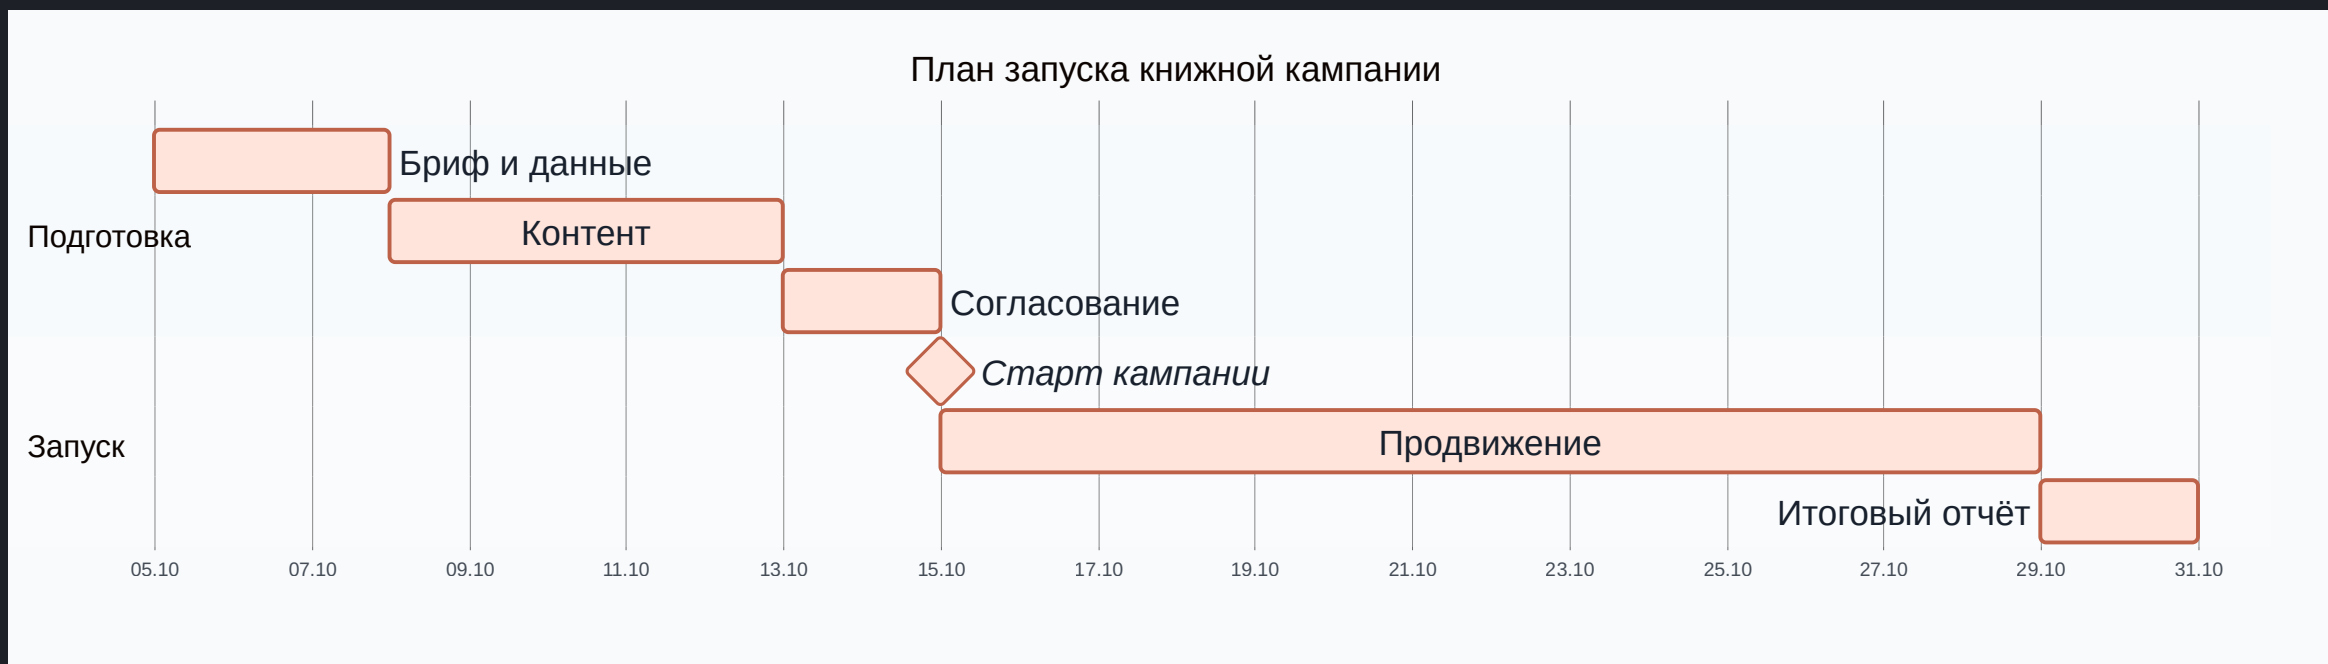

Бриф: 5–8 октября. Контент: 8–13 октября. Согласование: 13–15 октября.

Интервалы указаны от начала до исключённой даты окончания; дни календарные.

## Календарь для сверки диаграммы Ганта

| Этап         | Начало | Окончание, не включая | Дней |
|--------------|--------|-----------------------|------|
| Бриф         | 05.10  | 08.10                 | 3    |
| Контент      | 08.10  | 13.10                 | 5    |
| Согласование | 13.10  | 15.10                 | 2    |
| Продвижение  | 15.10  | 29.10                 | 14   |
| Отчёт        | 29.10  | 31.10                 | 2    |

Задержка согласования сдвигает запуск, если план не пересмотрен.

## Риски обсуждаем вместе с решением

| Риск                | Ранний сигнал             | Действие                          |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Материалы не готовы | Нет согласования к 15.10  | Пересмотреть дату запуска         |
| Расходы выше плана  | Превышен лимит статьи     | Согласовать изменение             |
| Падает отклик       | Снижение отклика рассылки | Проверить предложение и аудиторию |

Не объясняем изменение продаж одной рекламой без сравнения и дополнительных данных.

## Решение и следующий шаг

Согласовать бюджет 1,2 млн ₽ и дату запуска 15 октября.

Маркетолог отвечает за календарь и расходы; редактор — за содержание; аналитик — за сверку показателей.

Через неделю после запуска: продажи по каналам, расходы по статьям, список отклонений.

## Контрольные значения для переноса

- 14 слайдов; последовательность сохранена.
- Продажи: **10 000 экземпляров**, выручка **4 620 тыс. ₽**.
- Бюджет: 1 200 тыс. ₽, сумма долей **100%**.
- Гант: запуск **15.10**, продвижение **14 дней**.
- Шесть диаграмм: столбцы, линия, круг, процесс, взаимодействие, Гант.
- Ни одна диаграмма не осталась блоком исходного кода.
