

Книжная кампания: результаты и план запуска

Решение для руководителя: согласовать бюджет 1,2 млн ₽ и календарь кампании.

Цель — поддержать продажи подборки книг в трёх каналах.

Все числа в примере — учебные данные, не отчёт компаний марафона.

Что требуется согласовать

- Бюджет: **1 200 тыс. ₽.**
- Старт продвижения: **15 октября 2026 года.**
- Продолжительность продвижения: **14 календарных дней.**
- Еженедельный контроль продаж, расходов и готовности материалов.

Исходные данные: один период, одинаковые единицы

Канал	Экземпляры	Выручка, тыс. ₽
Магазины	2 400	1 440
Маркетплейсы	3 600	1 980
Цифровой	4 000	1 200
Итого	10 000	4 620

Один четырёхнедельный период. Выручка не равна прибыли.


Цифровой канал лидирует по количеству



4 000 экземпляров — 40% количества. Это не доля выручки.

Контроль: $2\,400 + 3\,600 + 4\,000 = 10\,000$.


Недельные продажи растут в учебном примере

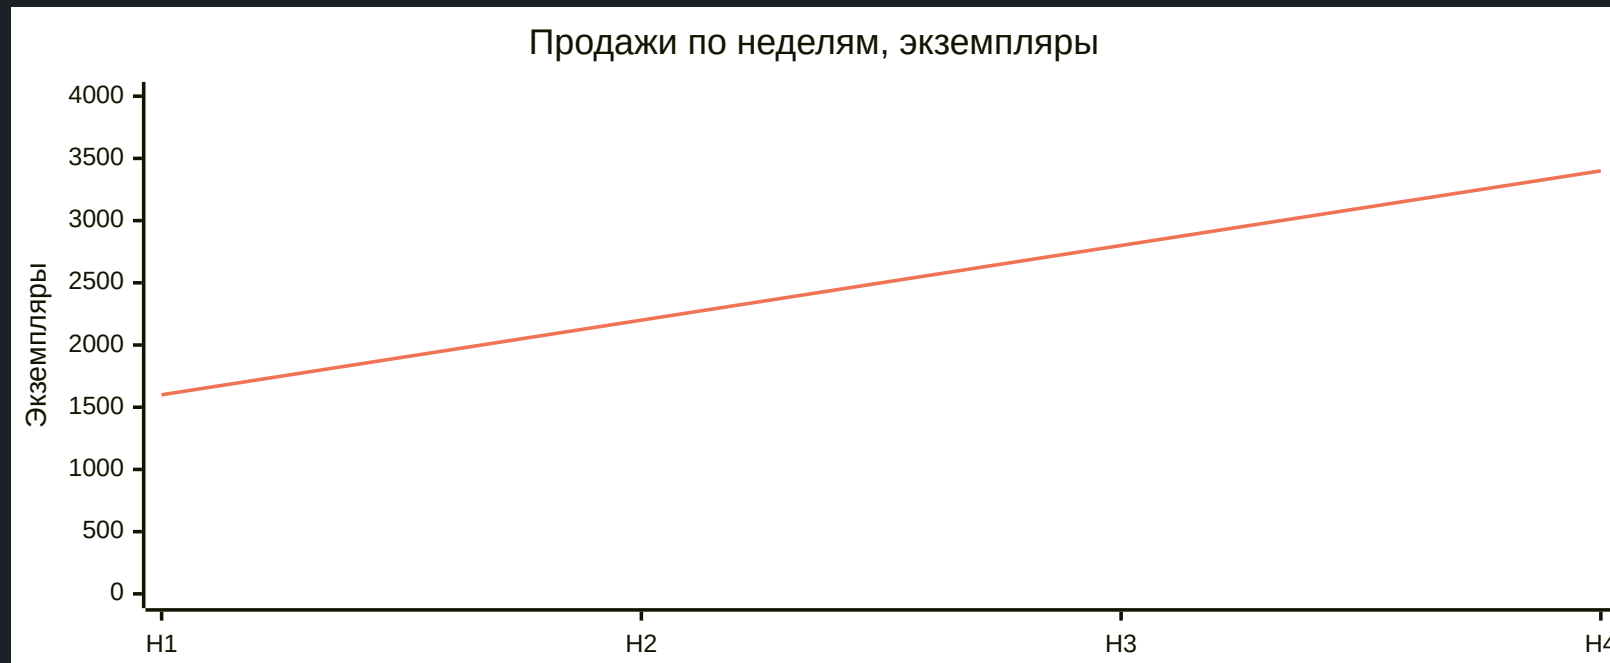

H1: 1 600 · H2: 2 200 · H3: 2 800 · H4: 3 400.

Сумма — 10 000. Рост с H1 до H4 — 112,5%; причинный эффект рекламы не доказан.

Половину бюджета направляем на рекламу

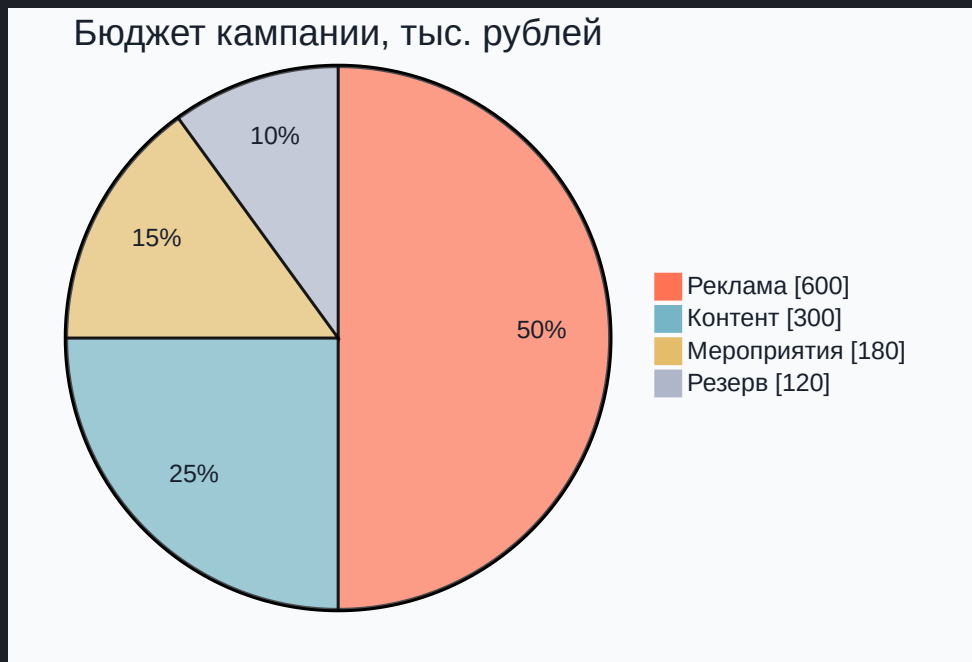

$600 + 300 + 180 + 120 = 1\,200$ тыс. ₽.


Доли: 50% / 25% / 15% / 10%.

У расходов есть назначение и ответственный

Статья	Тыс. ₽	Доля	Назначение
Реклама	600	50%	Привлечь читателей
Контент	300	25%	Подготовить материалы
Мероприятия	180	15%	Представить подборку
Резерв	120	10%	Покрыть согласованные изменения


Резерв расходуется только после отдельного согласования.

Материалы проходят проверку до запуска

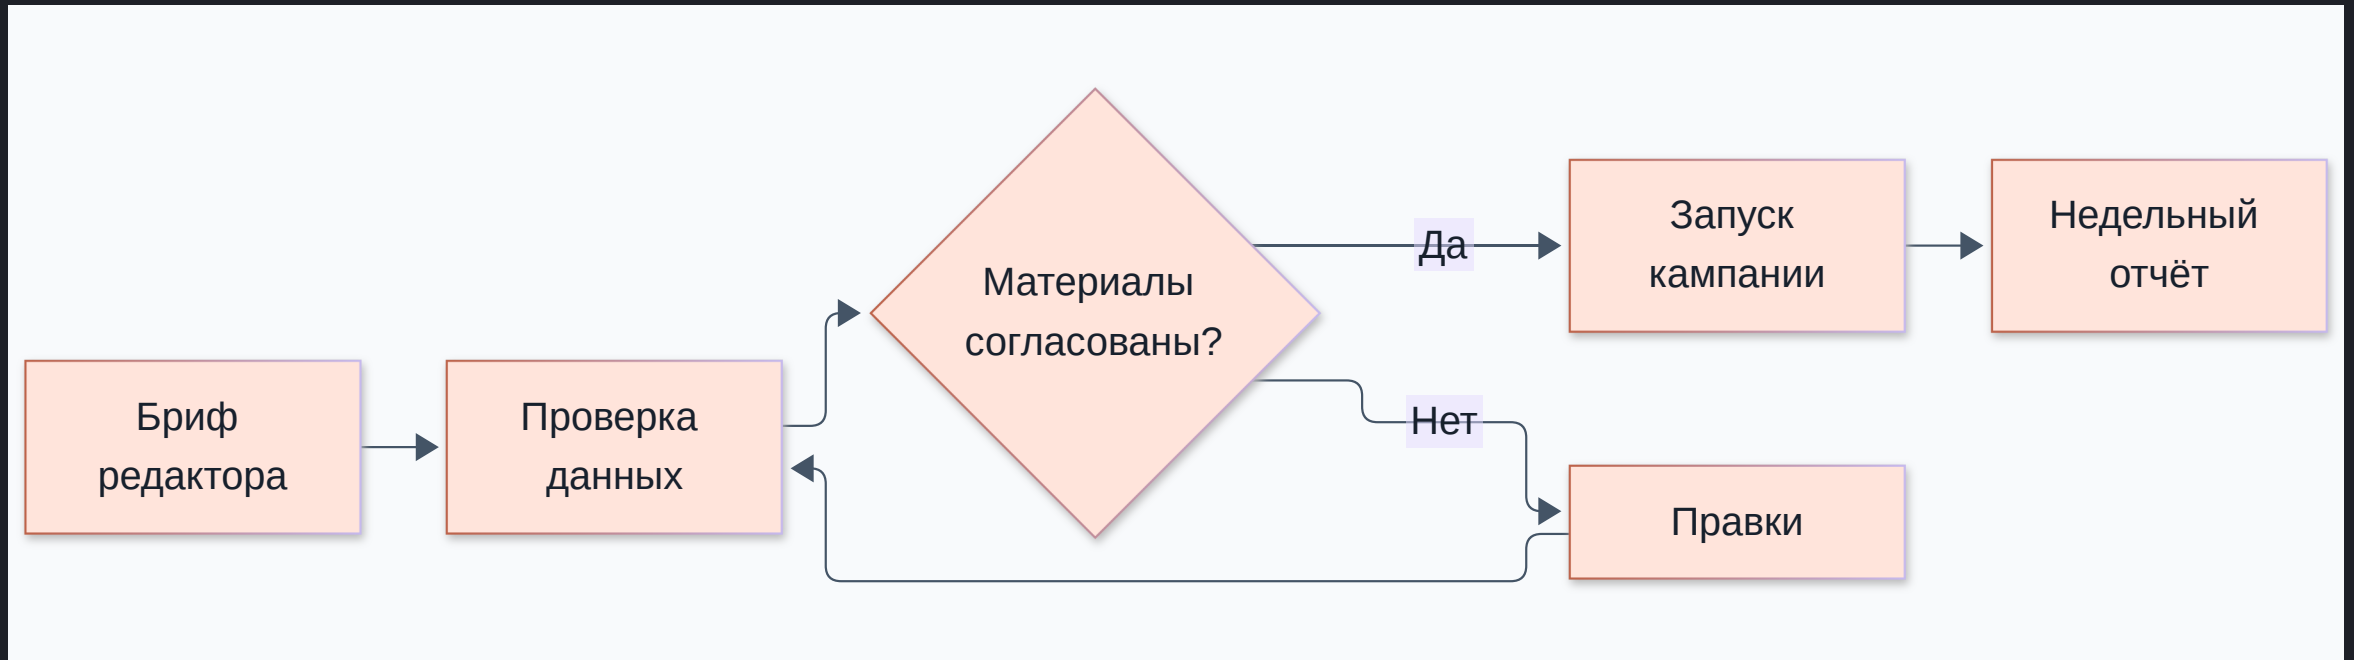


Правки возвращаются на проверку данных; запуск разрешён после согласования.

Редактор и маркетолог согласуют один макет

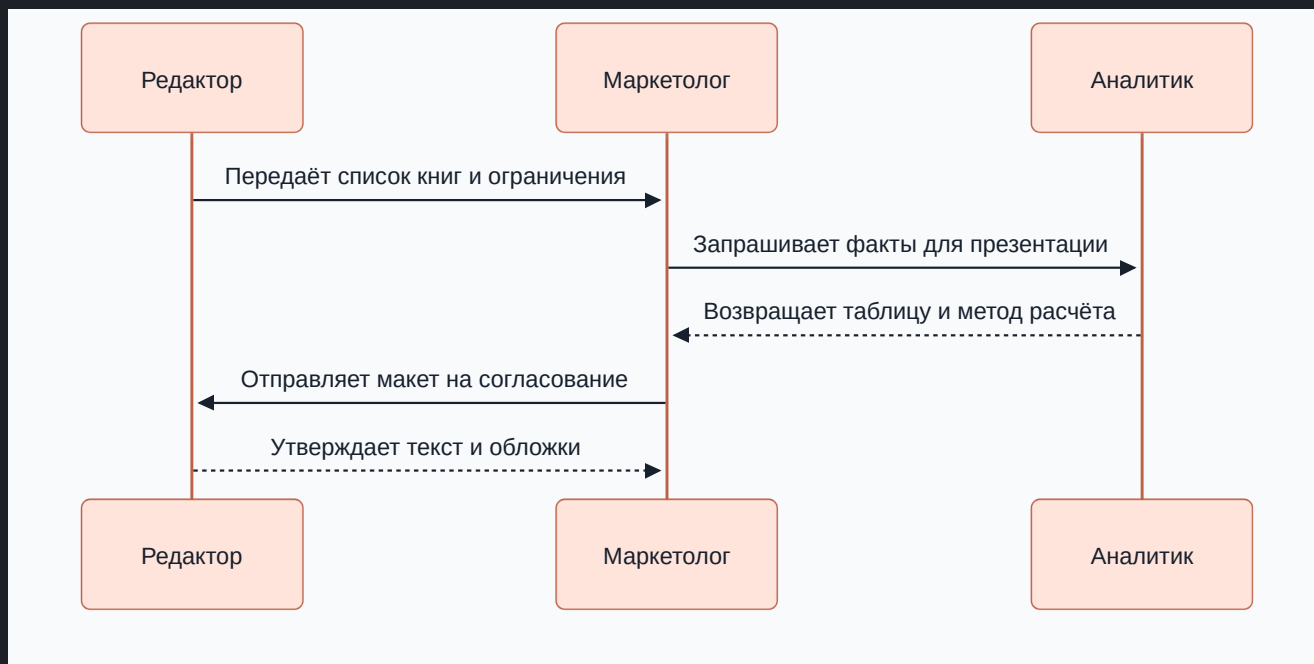

Запуск зависит от готовности контента

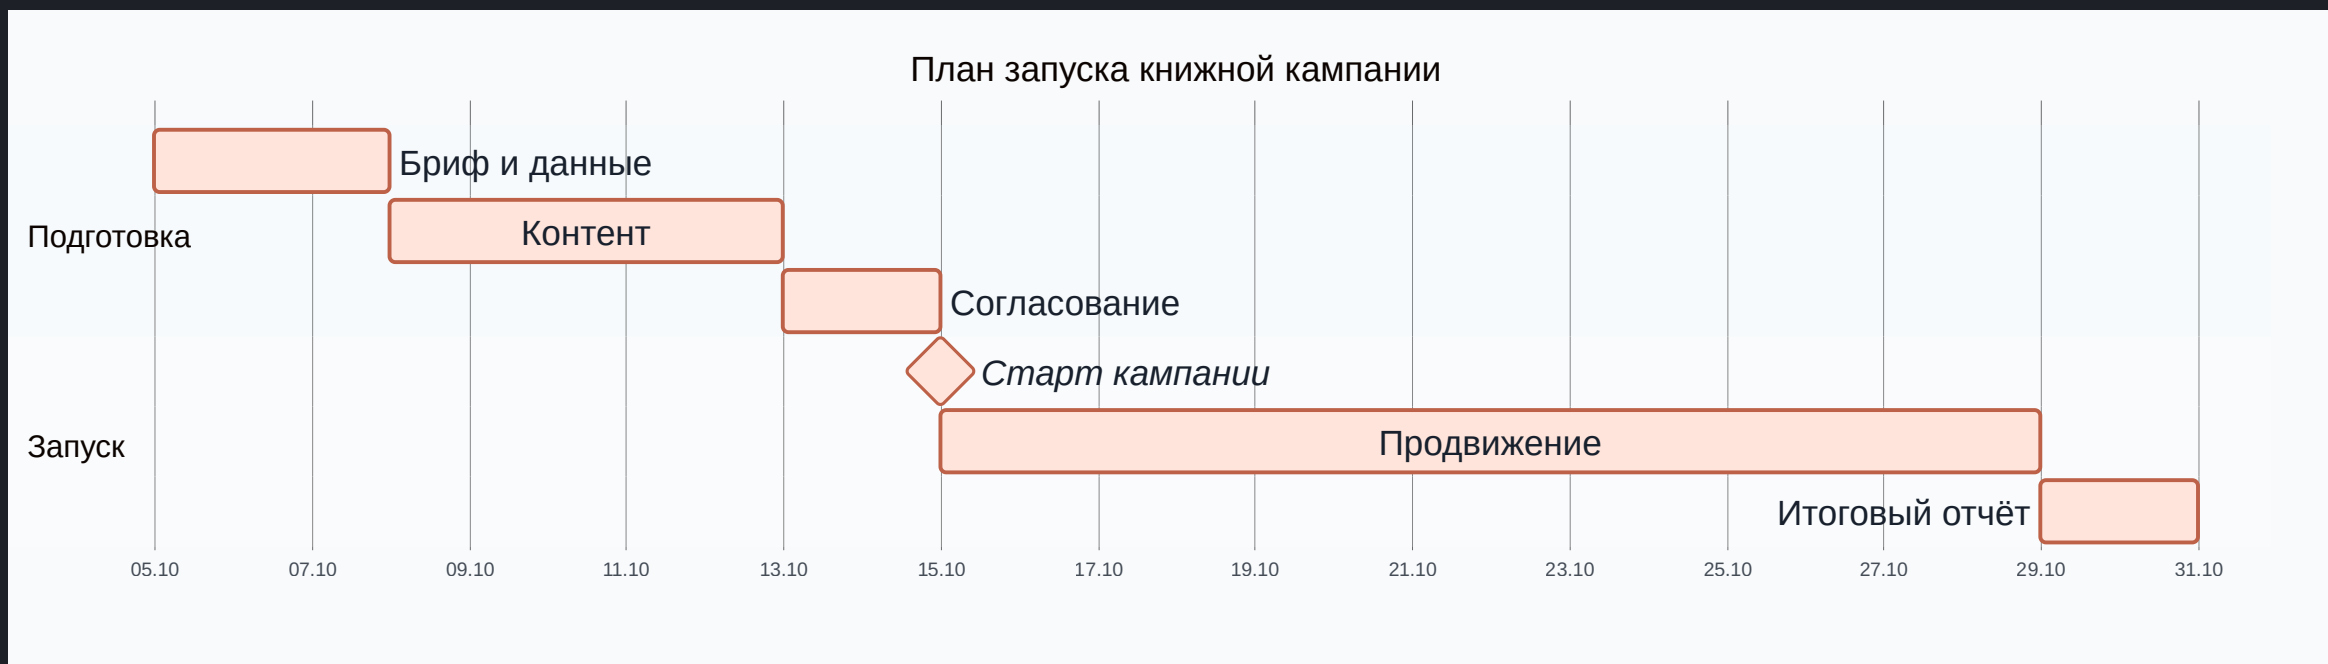

Бриф: 5–8 октября. Контент: 8–13 октября. Согласование: 13–15 октября.

Интервалы указаны от начала до исключённой даты окончания; дни календарные.

Календарь для сверки диаграммы Ганта

Этап	Начало	Окончание, не включая	Дней
Бриф	05.10	08.10	3
Контент	08.10	13.10	5
Согласование	13.10	15.10	2
Продвижение	15.10	29.10	14
Отчёт	29.10	31.10	2

Задержка согласования сдвигает запуск, если план не пересмотрен.

Риски обсуждаем вместе с решением

Риск	Ранний сигнал	Действие
Материалы не готовы	Нет согласования к 15.10	Пересмотреть дату запуска
Расходы выше плана	Превышен лимит статьи	Согласовать изменение
Падает отклик	Снижение отклика рассылки	Проверить предложение и аудиторию

Не объясняем изменение продаж одной рекламой без сравнения и дополнительных данных.

Решение и следующий шаг

Согласовать 1,2 млн ₽ и дату запуска 15 октября.

Маркетолог отвечает за календарь и расходы; редактор — за содержание; аналитик — за сверку показателей.

Через неделю после запуска: продажи по каналам, расходы по статьям, список отклонений.

Контрольные значения для переноса

- 14 слайдов; последовательность сохранена.
- Продажи: **10 000 экземпляров**, выручка **4 620 тыс. ₽**.
- Бюджет: **1 200 тыс. ₽**, сумма долей **100%**.
- Гант: запуск **15.10**, продвижение **14 дней**.
- Шесть диаграмм: столбцы, линия, круг, процесс, взаимодействие, Гант.
- Ни одна диаграмма не осталась блоком исходного кода.
